


识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本
1	*	启动	7 个工作日	2019年3月29日	2019年4月8日			¥8, 700. 00
2		任命项目经理	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日			¥0.00
3		组建核心团队	1 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日		UI设计师,产品约	¥6, 300.00
4		制定时间计划及里程碑	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日			¥600.00
5	-	分析干系人	2 个工作日	2019年4月3日	2019年4月4日			¥1,200.00
6	-5	制定项目章程	1 个工作日?	2019年4月5日	2019年4月5日	2, 3, 4, 5		¥600.00
7	-5	项目启动大会	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	6		¥0.00
8	*	规划	45 个工作日	2019年4月9日	2019年6月10日			¥42, 600. 00
9	-5	规划范围	16 个工作日	2019年4月9日	2019年4月30日			¥21, 200. 00
10	-5	制定需求说明书	8 个工作日	2019年4月9日	2019年4月18日	7	需求专家,产品约	¥9,600.00
11	-5	界面设计	5 个工作日	2019年4月19日	2019年4月25日	10	UI设计师	¥2,000.00
12	-5	详细设计说明书	5 个工作日	2019年4月19日	2019年4月25日	10	产品经理,架构则	¥6,000.00
13	-5	范围说明书	3 个工作日	2019年4月19日	2019年4月23日	10		¥1,800.00
14	-5	创建WBS	2 个工作日	2019年4月26日	2019年4月29日	11, 12, 13	项目经理	¥1, 200.00
15	-5	形成范围基准	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	14	项目经理	¥600.00
16	*	规划时间	8 个工作日	2019年5月1日	2019年5月10日			¥3, 600. 00
17	-5	排列工作包顺序	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	15	项目经理	¥600.00
.8	-5	估算资源	2 个工作日	2019年5月2日	2019年5月3日	17	项目经理	¥1,200.00
.9		估算持续时间	2 个工作日	2019年5月7日	2019年5月8日	18	项目经理	¥1, 200.00
20	- 5	制定进度计划	1 个工作日	2019年5月9日	2019年5月9日	19	项目经理	¥600.00
21	*	规划成本	6 个工作日	2019年5月10日	2019年5月17日			¥3,000.00
22	-5	项目成本估算	3 个工作日	2019年5月10日	2019年5月14日	20	项目经理	¥1,800.00
23	- 5	项目预算	2 个工作日	2019年5月15日	2019年5月16日	22	项目经理	¥1,200.00
24	-5	规划质量	8 个工作日	2019年5月1日	2019年5月10日			¥6, 400.00
25	-5	制定测试计划	2 个工作日	2019年5月1日	2019年5月2日	15		¥1,600.00
26	-5	制定测试用例	6 个工作日	2019年5月3日	2019年5月10日	25	质量专家	¥4,800.00
27	*	规划人力资源	4 个工作日	2019年5月17日	2019年5月22日			¥2, 400.00
28	- 5	制定人力资源计划	2 个工作日	2019年5月17日	2019年5月20日	18	项目经理	¥1, 200.00
29	-5	制定人员配备管理计划	2 个工作日	2019年5月21日	2019年5月22日	28	项目经理	¥1, 200.00
30	-5	规划沟通	2 个工作日	2019年5月23日	2019年5月24日			¥1, 200. 00
81	-5	制定沟通管理计划	2 个工作日	2019年5月23日	2019年5月24日	29		¥1, 200.00
2	-5	规划采购	4 个工作日	2019年5月27日	2019年5月30日			¥2, 400.00
33	-5	自制外购分析	1 个工作日	2019年5月27日	2019年5月27日	18		¥600.00
34	-9	制定采购计划	3 个工作日	2019年5月28日	2019年5月30日	33	项目经理	¥1,800.00
		任务	非活动任	:务	手动摘要总成		外部里程碑 ◇	
			11.14 -1 E		手动摘要		最后期限 ◆	
目: 旅	ξ游平台WBS.mpp					ı		
	019年4月12日	上住曜 →	非活动摘		□ 仅开始时间 □		进度	
.,. = =	, ,,	摘要	手动任务		■ 仅完成时间 ■		手动进度	
		项目摘要 『	【 仅工期		外部任务 ===			
		I		第 1 页				

号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本
5	-5	规划风险	3 个工作日	2019年5月31日	2019年6月4日			¥1, 800. 00
6	-5	识别风险	1 个工作日	2019年5月31日	2019年5月31日	16, 21, 24, 2	7. (项目经理	¥600.00
7	-5	风险分析	1 个工作日	2019年6月3日	2019年6月3日	36	项目经理	¥600.00
3	-5	制定风险登记册	1 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日	37	项目经理	¥600.00
	-5	规划整合	1 个工作日	2019年6月5日	2019年6月5日	38	项目经理	¥600.00
)	-5	执行与监控	35 个工作日	2019年5月6日	2019年6月21日			¥50, 200. 00
III		组建项目团队	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日	18	测试工程师1,	
	*	项目执行	10 个工作日	2019年5月6日	2019年5月17日			¥6, 500.00
	*	游客模块	10 个工作日	2019年5月6日	2019年5月17日			¥3, 000. 00
	<u></u>	登录注册	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	41	开发工程师1	¥500.00
	-5	发布期望导游信息	1 个工作日	2019年5月8日	2019年5月8日	44	开发工程师1	¥500.00
	-5	搜索导游信息	1 个工作日	2019年5月9日	2019年5月9日	45	开发工程师1	¥500.00
	- 5	评价反馈	1 个工作日	2019年5月10日	2019年5月10日	46	开发工程师1	¥500.00
	- 5	个人信息页面	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	47	开发工程师1	¥500.00
	-5	支付定金	1 个工作日	2019年5月14日	2019年5月14日	48	开发工程师1	¥500.00
	5	导游模块	4 个工作日	2019年5月7日	2019年5月10日			¥2,000.00
	- 5	导游认证	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	41	开发工程师2	¥500.00
	- 5	发布旅游解说信息	1 个工作日	2019年5月8日	2019年5月8日	51	开发工程师2	¥500.00
	- 5	导游信息页面	1 个工作日	2019年5月9日	2019年5月9日	52	开发工程师2	¥500.00
	- 5	领取工资	1 个工作日	2019年5月10日	2019年5月10日	53	开发工程师2	¥500.00
	- 5	管理员模块	3 个工作日	2019年5月7日	2019年5月9日			¥1, 500.00
	- 5	导游审核	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	41	开发工程师3	¥500.00
	-5	流量统计	1 个工作日	2019年5月8日	2019年5月8日	56	开发工程师3	¥500.00
	-5	数据备份	1 个工作日	2019年5月9日	2019年5月9日	57	开发工程师3	¥500.00
	-5	项目监控	4 个工作日	2019年6月6日	2019年6月11日			¥15, 500. 00
-	<u> </u>	各项指标监控	1 个工作日	2019年6月6日	2019年6月6日	41	测试工程师1,	测¥1,600.00
	-5	监控评审	1 个工作日	2019年6月7日	2019年6月7日	60	UI设计师,产品	
	-5	变更评审	1 个工作日	2019年6月10日	2019年6月10日	61	UI设计师,产品	
-	<u> </u>	例会	1 个工作日	2019年6月11日	2019年6月11日	41	UI设计师,测i	式□¥6,300.00
	-5	管理干系人	3 个工作日	2019年6月12日	2019年6月14日			¥1,800.00
		发布项目信息	1 个工作日	2019年6月12日	2019年6月12日	41	项目经理	¥600.00
		报告监控指标	1 个工作日	2019年6月13日	2019年6月13日	41	项目经理	¥600.00
-	<u> </u>	干系人沟通	1 个工作日	2019年6月14日	2019年6月14日	41	项目经理	¥600.00
	*	团队建设	3 个工作日	2019年6月17日	2019年6月19日			¥18, 900. 00
		任务	非活动化	壬务	手动摘要总成		外部里程碑 ◇	
		I /\		L程碑 ◇	手动摘要		最后期限 ◆	
]: 旅	、 该游平台WBS.mpp							
月: 20	019年4月12日		非活动 才 		■ 仅开始时间 □		进度 ——	
		摘要	手动任务	F Comment	■ 仅完成时间 ■		手动进度 ——	
		项目摘要 🏻 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀	■ 仅工期		外部任务 ===			


标识号	任务模	王式 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称 成本
69	<u> </u>	培训	1 个工作日	2019年6月17日	2019年6月17日	41	UI设计师,测试]¥6,300.00
70	√ =	娱乐活动	1 个工作日	2019年6月18日	2019年6月18日	41	UI设计师,测试コ\\46,300.00
71		沟通	1 个工作日	2019年6月19日	2019年6月19日	70	UI设计师,测试□¥6,300.00
72	·	采购	1 个工作日	2019年6月20日	2019年6月20日		项目经理 ¥600.00
73	≡	项目验收	1 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日	42	UI设计师,产品约¥3,800.00
74	*	收尾	4 个工作日	2019年6月24日	2019年6月27日		¥10, 700. 00
75	-	项目终验	1 个工作日	2019年6月24日	2019年6月24日	73	UI设计师,产品约¥3,800.00
76	Ⅲ	结束采购	1 个工作日	2019年6月25日	2019年6月25日	73	项目经理 ¥600.00
77	Ⅲ	项目内部收尾	1 个工作日	2019年6月26日	2019年6月26日	73	UI设计师,测试□¥6,300.00
78	*						¥0.00




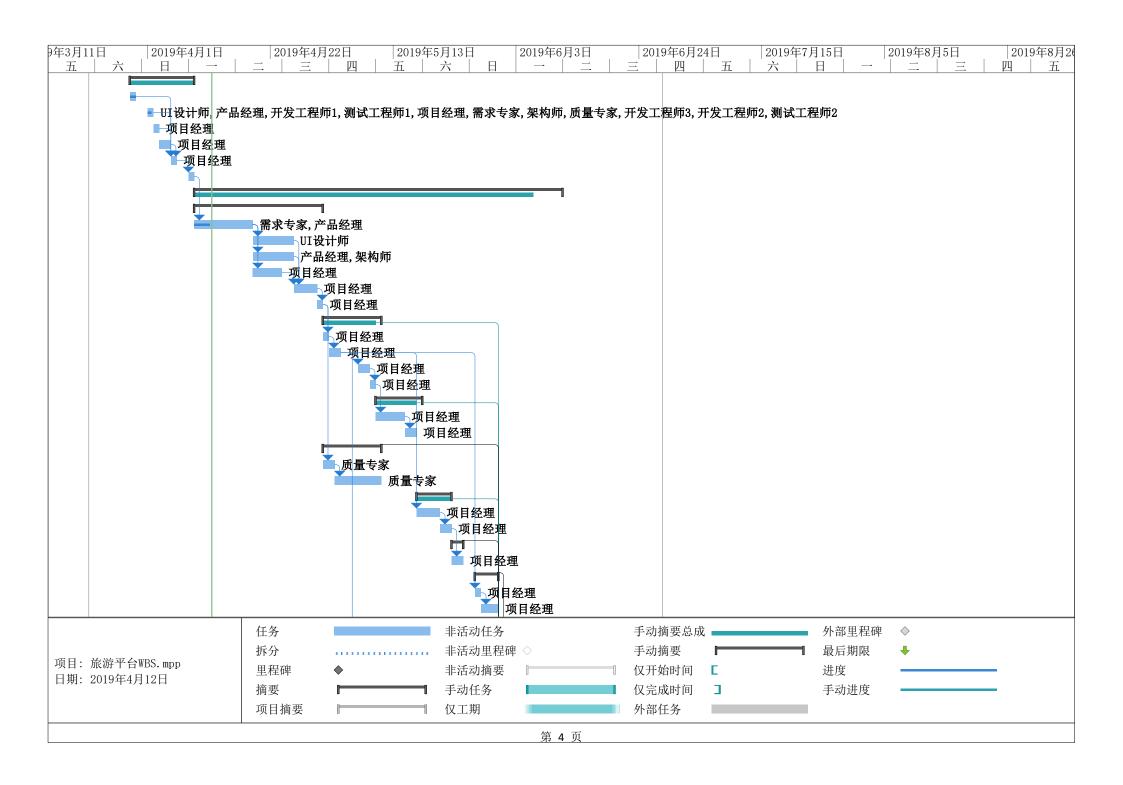

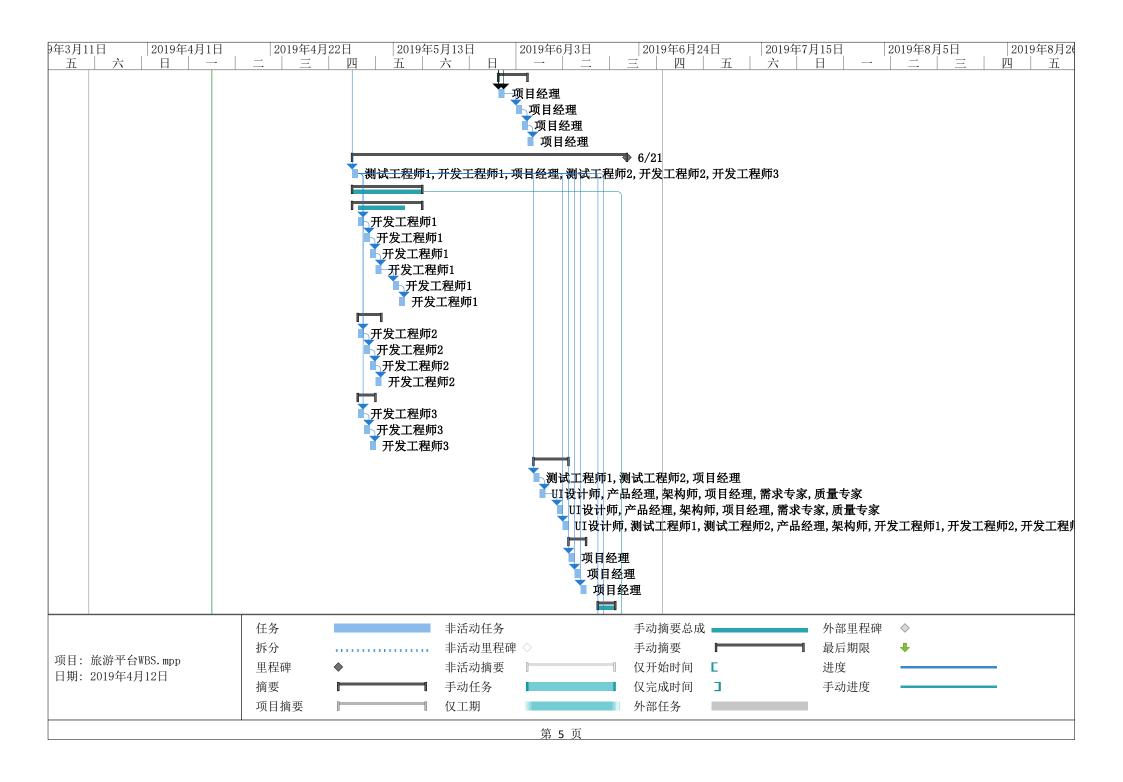

9年3月11日 2019年4月1日 五 六 日 一	2019年4月22日 20 二 三 四 五		2019年6月24日 2019 <u>三 四 五 六</u> _ UI设计师, 测试工程师1, 测试工程		019年8月5日 2019年8月26
			UI设计师,测试工程师1,测试工程 UI设计师,测试工程师1,测试工 项目经理	呈师2, 产品经理, 架构 程师2, 产品经理, 架构]师, 开发工程师1, 开发工程师2, 开 钩师, 开发工程师1, 开发工程师2, 牙
			UI设计师,产品经理,架构师, UI设计师,产品经理,架构 项目经理		
			UI设计师,测试工程师1,	,测试工程师2,产品组	圣理, 架构师, 开发工程师1, 开发工 ⁵
	任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑	♦
项目:旅游平台WBS.mpp	拆分 里程碑 ◆	非活动里程碑 ◇非活动摘要 『	手动摘要 ■	一 最后期限 进度	+
日期: 2019年4月12日	摘要	手动任务	■ 仅完成时间 3	手动进度	
	项目摘要	── 』 仅工期	外部任务		

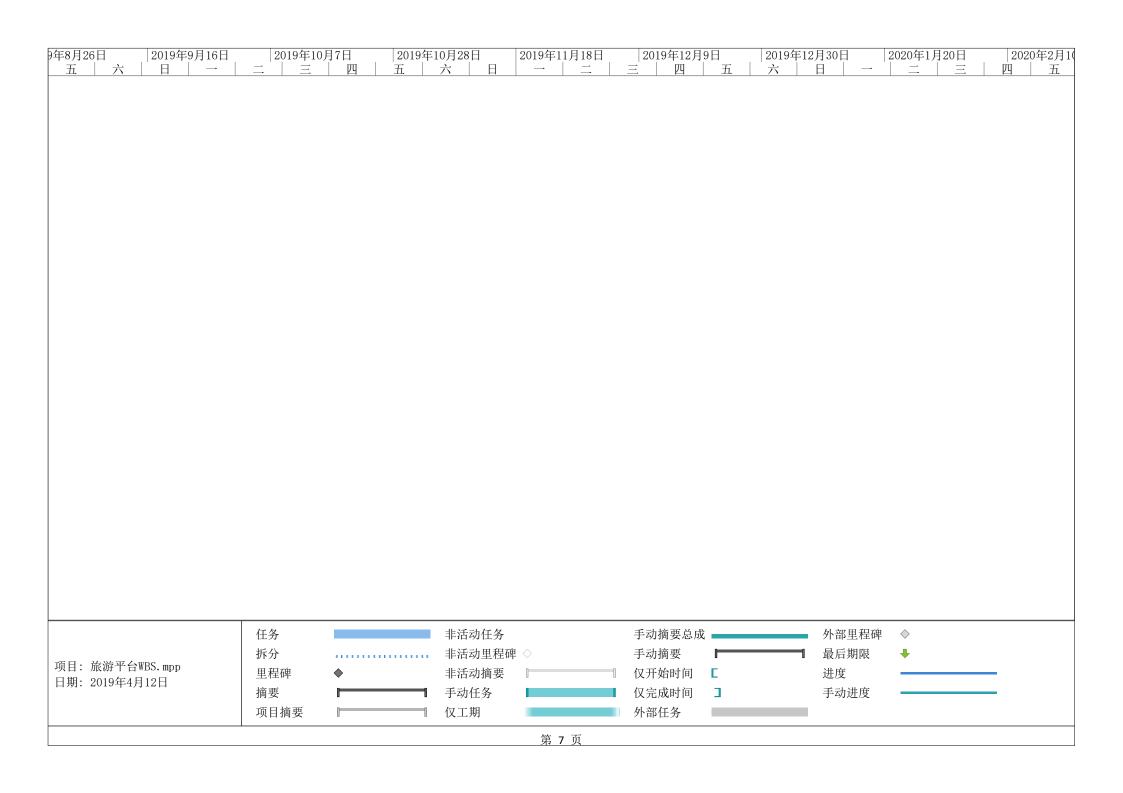

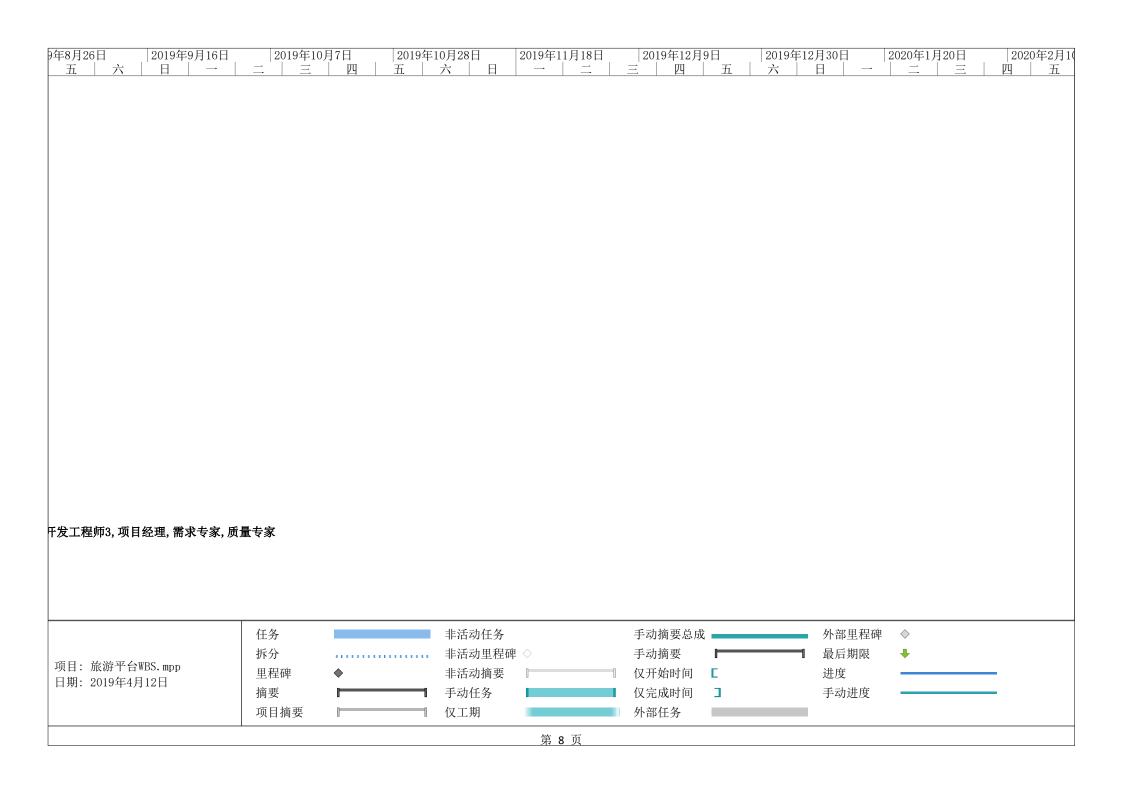

9年8月26日 2019年9月16日 五 六 日 一 星师2, 开发工程师3, 项目经理, 需求等 程师2, 开发工程师3, 项目经理, 需求 工程师2, 开发工程师3, 项目经理, 需求	专家, 质量专家		0月28日 2019年11月18日 六 日 一 二	日 2019年12月9日 三 四 五	2019年12月30日 2 六	2020年1月20日 2020年2月10 二
1, 开发工程师2, 开发工程师3, 项目经	理, 需求专家, 质量	≹专家				
	IT D		ナエニ・バク	工斗校而以中	AI 文V H 4日 7位	
项目: 旅游平台WBS.mpp 日期: 2019年4月12日		*	非活动任务 非活动里程碑 ◇ 非活动摘要 手动任务 仅工期	手动摘要总成 手动摘要 【 仅开始时间 【 人部任务	外部里程碑最后期限进度手动进度	♦
			第 9 页			
