


识号	任务模式	任务名称	工期	开始 完成时间 时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	2
1	*	启动	7 个工作日	2019 2019年4月8日			¥8, 700. 00	¥3, 975. 00	
2 🗸		任命项目经理	1 个工作日	2019 2019年3月29日			¥0.00	¥0.00	
3		组建核心团队	1 个工作日	2019 2019年4月1日		UI设计师,产品组	¥6, 300.00	¥1,575.00	
4		制定时间计划及		2019 2019年4月2日		项目经理	¥600.00	¥600.00	
5		分析干系人	2 个工作日	2019 2019年4月4日		项目经理	¥1, 200.00	¥1, 200. 00	
6	-3	制定项目章程	1 个工作日?	2019 2019年4月5日	2, 3, 4, 5	项目经理	¥600.00	¥600.00	
7	-3	项目启动大会	1 个工作日	2019 2019年4月8日	6	,,,,. <u></u>	¥0.00	¥0.00	
8	*	规划	45 个工作日	2019 2019年6月10日			¥42, 600. 00	¥39, 240. 00	
9	-5	规划范围	16 个工作日	2019 2019年4月30日			¥21, 200. 00	¥17, 840. 00	
10	-	制定需求说明		2019 2019年4月18日	7	需求专家,产品	¥9,600.00	¥6, 240. 00	
11	-5	界面设计	5 个工作日	2019 2019年4月25日	10	UI设计师	¥2,000.00	¥2,000.00	
12	-5	详细设计说明		2019 2019年4月25日	10	产品经理,架构	¥6,000.00	¥6,000.00	
13	-	范围说明书	3 个工作日	2019 2019年4月23日	10	项目经理	¥1,800.00	¥1,800.00	
14	-5	创建WBS	2 个工作日	2019 2019年4月29日	11, 12, 13		¥1, 200.00	¥1, 200. 00	
15	-5	形成范围基准	1 个工作日	2019 2019年4月30日	14	项目经理	¥600.00	¥600.00	
16	*	规划时间	8 个工作日	2019 2019年5月10日			¥3,600.00	¥3, 600. 00	
17	-5	排列工作包顺风		2019 2019年5月1日	15	项目经理	¥600.00	¥600.00	
18	-	估算资源	2 个工作日	2019 2019年5月3日	17	项目经理	¥1, 200.00	¥1, 200. 00	
19		估算持续时间	2 个工作日	2019 2019年5月8日	18	项目经理	¥1, 200.00	¥1, 200. 00	
20		制定进度计划	1 个工作日	2019 2019年5月9日	19	项目经理	¥600.00	¥600.00	
21	*	规划成本	6 个工作日	2019 2019年5月17日			¥3,000.00	¥3, 000. 00	
22	-5	项目成本估算	3 个工作日	2019 2019年5月14日	20	项目经理	¥1,800.00	¥1,800.00	
23	-	项目预算	2 个工作日	2019 2019年5月16日	22	项目经理	¥1, 200.00	¥1, 200. 00	
24	-	规划质量	8 个工作日	2019 2019年5月10日			¥6, 400.00	¥6, 400. 00	
25	-5	制定测试计划	2 个工作日	2019 2019年5月2日	15	质量专家	¥1,600.00	¥1,600.00	
26	-	制定测试用例	6 个工作日	2019 2019年5月10日	25	质量专家	¥4,800.00	¥4,800.00	
27	*	规划人力资源	4 个工作日	2019 2019年5月22日		, , <u></u> , , ,	¥2, 400.00	¥2, 400. 00	
28	i -	制定人力资源计		2019 2019年5月20日	18	项目经理	¥1, 200. 00	¥1, 200. 00	
29	-3	制定人员配备		2019 2019年5月22日	28	项目经理	¥1, 200.00	¥1, 200. 00	
30	-3	规划沟通	2 个工作日	2019 2019年5月24日			¥1, 200. 00	¥1, 200. 00	
31	-5	制定沟通管理计		2019 2019年5月24日	29	项目经理	¥1, 200. 00	¥1, 200. 00	
32	-5	规划采购	4 个工作日	2019 2019年5月30日		7, 6, 2, 2	¥2, 400. 00	¥2, 400. 00	
33		自制外购分析	1 个工作日	2019 2019年5月27日	18	项目经理	¥600.00	¥600.00	
34	-	制定采购计划	3 个工作日	2019 2019年5月30日	33	项目经理	¥1,800.00	¥1,800.00	
-		任务		非活动任务		三动摘要总成	外部里程碑	♦	
		拆分		45 14 -1. EL 4E 4E 4		三动摘要	最后期限	•	
5目: 旅	该游平台WBS.mpp							▼	
	019年4月25日	上 生 住 阵	♦	非活动摘要		₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹	进度		
		摘要		手动任务		又完成时间]	手动进度		
		项目摘要		【 仅工期	5	卜部任务			
		ı		第 1					

识号	任务模式	任务名称	工期	开始 完成时间 时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本
35	5	规划风险	3 个工作日	2019 2019年6月4日			¥1, 800. 00	¥1, 800. 00
36	-5	识别风险	1 个工作日	2019 2019年5月31日	16, 21,	24, 27, : 项目经理	¥600.00	¥600.00
37	-5	风险分析	1 个工作日	2019 2019年6月3日	36	项目经理	¥600.00	¥600.00
38	- 5	制定风险登记册		2019 2019年6月4日	37	项目经理	¥600.00	¥600.00
39	- 5	规划整合	1 个工作日	2019 2019年6月5日	38	项目经理	¥600.00	¥600.00
10		执行与监控	35 个工作日				¥50, 200. 00	¥36, 025. 00
1	-5	组建项目团队	1 个工作日	2019 2019年5月6日	18	测试工程师1,	开¥3,100.00	¥3, 100. 00
2	*	项目执行	10 个工作日	2019 2019年5月17日			¥6, 500.00	¥6, 500. 00
3	*	游客模块	10 个工作日	2019 2019年5月17日			¥3, 000. 00	¥3, 000. 00
4	-5	登录注册	1 个工作日	2019 2019年5月7日	41	开发工程师1	¥500.00	¥500.00
5	-5	发布期望导流	游1 个工作日	2019 2019年5月8日	44	开发工程师1	¥500.00	¥500.00
6	-5		息1 个工作日	2019 2019年5月9日	45	开发工程师1	¥500.00	¥500.00
7	-5	评价反馈	1 个工作日	2019 2019年5月10日	46	开发工程师1	¥500.00	¥500.00
3	-5		面1 个工作日	2019 2019年5月13日	47	开发工程师1	¥500.00	¥500.00
)	-5	支付定金	1 个工作日	2019 2019年5月14日	48	开发工程师1	¥500.00	¥500.00
)	-5	导游模块	4 个工作日	2019 2019年5月10日			¥2,000.00	¥2,000.00
1	-	导游认证	1 个工作日	2019 2019年5月7日	41	开发工程师2	¥500.00	¥500.00
2	-5	发布旅游解记	兑1 个工作日	2019 2019年5月8日	51	开发工程师2	¥500.00	¥500.00
3	-5		面1 个工作日	2019 2019年5月9日	52	开发工程师2	¥500.00	¥500.00
Į.	-5	领取工资	1 个工作日	2019 2019年5月10日	53	开发工程师2	¥500.00	¥500.00
5	-5	管理员模块	3 个工作日	2019 2019年5月9日		,,,,,,	¥1, 500. 00	¥1, 500. 00
3	-5	导游审核	1 个工作日	2019 2019年5月7日	41	开发工程师3	¥500.00	¥500.00
7	-5	流量统计	1 个工作日	2019 2019年5月8日	56	开发工程师3	¥500.00	¥500.00
3	-5	数据备份	1 个工作日	2019 2019年5月9日	57	开发工程师3	¥500.00	¥500.00
)	5	项目监控	4 个工作日	2019 2019年6月11日			¥15, 500. 00	¥15, 500. 00
)	-5	各项指标监控	1 个工作日	2019 2019年6月6日	41	测试工程师1,	测¥1,600.00	¥1,600.00
-	-5	监控评审	1 个工作日	2019 2019年6月7日	60	UI设计师,产,	品纟¥3,800.00	¥3,800.00
2	5	变更评审	1 个工作日	2019 2019年6月10日	61	UI设计师,产,	品纟¥3,800.00	¥3,800.00
-	5	例会	1 个工作日	2019 2019年6月11日	41	UI设计师,测i	武J¥6, 300.00	¥6, 300. 00
:	-5	管理干系人	3 个工作日	2019 2019年6月14日			¥1, 800. 00	¥1,800.00
	-5	发布项目信息	1 个工作日	2019 2019年6月12日	41	项目经理	¥600.00	¥600.00
5	-5	报告监控指标	1 个工作日	2019 2019年6月13日	41	项目经理	¥600.00	¥600.00
7	-5	干系人沟通	1 个工作日	2019 2019年6月14日	41	项目经理	¥600.00	¥600.00
3	*	团队建设	3 个工作日	2019 2019年6月19日			¥18, 900. 00	¥4, 725. 00
		任务		非活动任务		手动摘要总成	外部里程碑	\Diamond
		拆分		II. Var - I. El alla arte.		手动摘要	最后期限	•
目: 旅游 ⁵	平台WBS.mpp							▼
	年4月25日	上 生 住 曜	•	非活动摘要		仅开始时间 [进度	
.,	. /	摘要		手动任务		仅完成时间]	手动进度	
		项目摘要		【 仅工期		外部任务		

标识号	^	任务模式	任务名称	工期	开始 完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	三月
	v				时间					2/25
69	\checkmark	-5	培训	1 个工作日	2019 2019年6月17日	41	UI设计师,测	试J¥6,300.00	¥0.00	
70	✓	- 5	娱乐活动	1 个工作日	2019 2019年6月18日	41		试J¥6,300.00	¥0.00	
71		- 5	沟通	1 个工作日	2019 2019年6月19日	70		试J¥6,300.00	¥4,725.00	
72		- 5	采购	1 个工作日	2019 2019年6月20日		项目经理	¥600.00	¥600.00	
73		-5	项目验收	1 个工作日	2019 2019年6月21日	42	UI设计师,产	品丝¥3,800.00	¥3,800.00	
74		*	收尾	4 个工作日	2019 2019年6月27日			¥10, 700.00	¥10, 700. 00	,
75		-5	项目终验	1 个工作日	2019 2019年6月24日	73	UI设计师,产	品丝¥3,800.00	¥3,800.00	
76		-5	结束采购	1 个工作日	2019 2019年6月25日	73	项目经理	¥600.00	¥600.00	
77		- 5	项目内部收尾	1 个工作日	2019 2019年6月26日	73	UI设计师,测	试J¥6,300.00	¥6,300.00	
78		*						¥0.00	¥0.00	



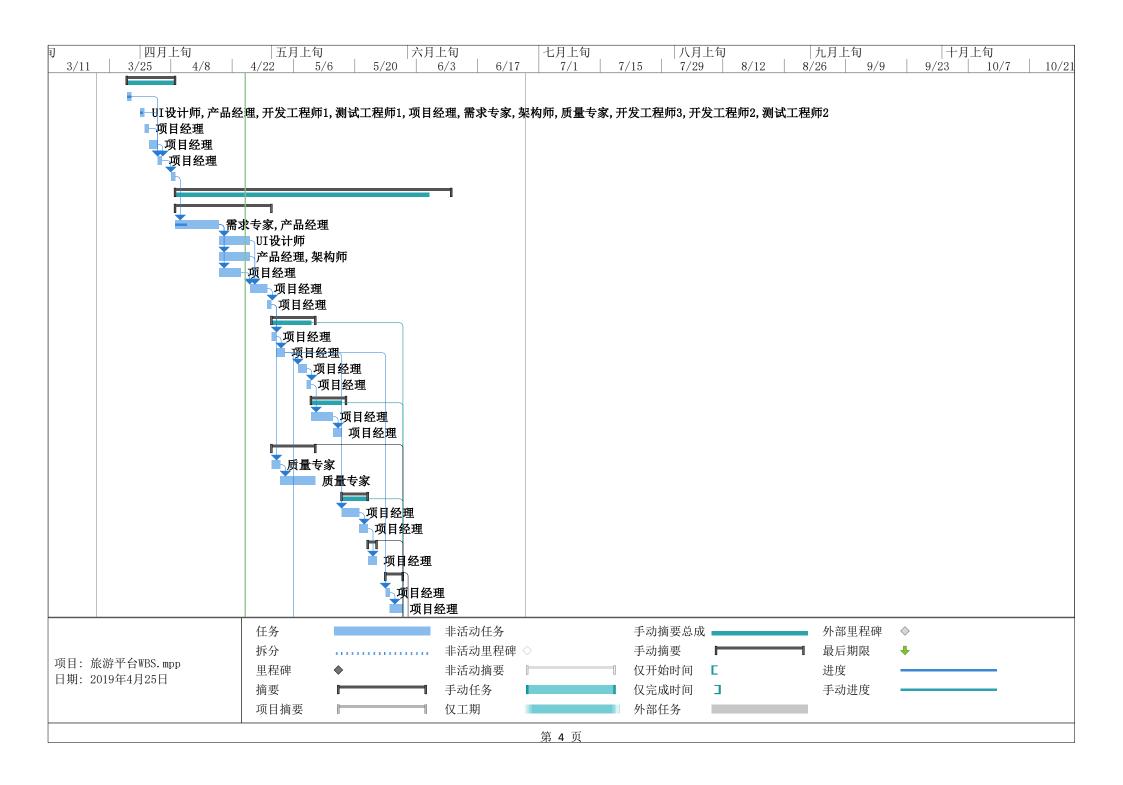

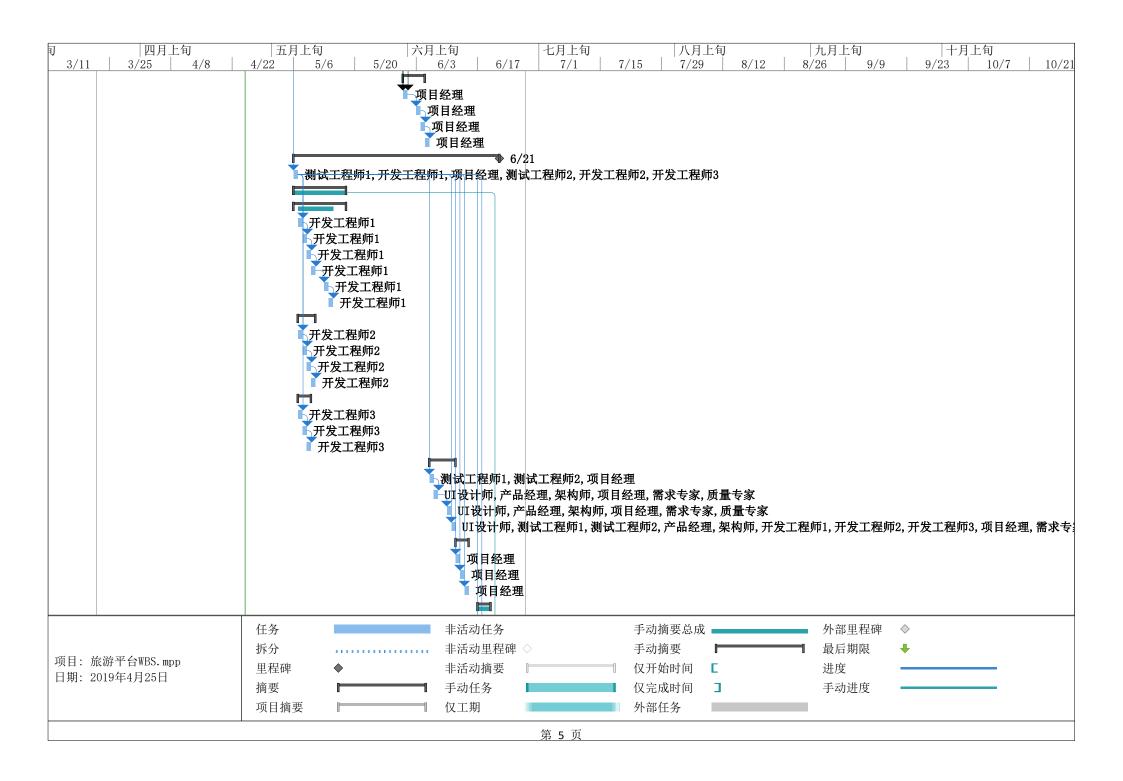

四月上旬	五月上旬			七月上旬	八月		九月上旬	十月上旬	
3/11 3/25 4/8	4/22	5/6 5/20	6/3 6/17	7/1	7/15 7/29	8/12	8/26 9/9	9/23 10/7	10/
								L程师2,开发工程师3,工 工程师2,开发工程师3,	
								工程师2,开发工程师3,	
				经理	, ••• • • • • • • • • • • • • • • • • •	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		71,7,1
			I U I i	设计师,产品经理,	架构师,项目经理	里,需求专家,质	量专家		
				电弧连接 文具级地	加拉萨 香豆鱼	文本 電子主字	氏具土安		
				JI设计师, 产品经理 项目经理	,朱ベ州,坝日等	2座, 而水 4 须,	灰里で		
			*		程师1,测试工程	师2, 产品经理,	, 架构师, 开发工程师:	1,开发工程师2,开发工范	星师3, 项
	任务		非活动任务		手动摘要总成	Ž —	外部里程碑	\Diamond	
页目:旅游平台WBS.mpp	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	•	
月日: 旅游平台WB5.mpp 日期: 2019年4月25日	里程碑	♦	非活动摘要		仅开始时间	Е	进度		
1/91. 2010—1/120日	摘要		手动任务		仅完成时间]	手动进度		
	项目摘要		仅工期		外部任务				
	次口順安	u u	以上州		21.电压光				

十一月上旬 10/21 11/4 11/18	十二月上旬 12/2 12	一月上旬 2/16 12/30	<u> </u>	月上旬 7 2/10	三月上旬 2/24 3/	9	3/23	上旬 4/6 4/	五月上旬 (20 5/	J 4 5/18	六月_ 6/
						·			·		
	任务		非活动任务		手动摘要总	Et:		→ 外部里程	碑 ◇		
	拆分		非活动生务		手动摘要思)4X		→ 介部里程1 → 最后期限	¥		
[目:旅游平台WBS.mpp	里程碑	♦	非活动摘要		** 仅开始时间	Ē		进度			
]期: 2019年4月25日	摘要		手动任务		【 仅完成时间			手动进度			
	项目摘要		仅工期		外部任务						
				第 7 页							

十一月上旬 10/21 11/4 11/18	十二月上旬 12/2 12	一月上旬 2/16 12/30 1	二月上旬 	三月上旬 2/10 2/24 3/9	四月上旬 3/23 4	J 4/6 4/20	五月上旬 5/4 5/18	六月 ₋ 8 6/
11/1	10/0 10		1, 10	2, 10 2, 21 0, 0	, o, b	1, 20	0,1	, , , ,
宗 求专家,质量专家								
	Lt b		-1エニカ <i>ロ ね</i>	ゴーレ 1分 平 ルー	42	Al 支加田 和中		
	任务		非活动任务	手动摘要总质	J. L.	外部里程碑	♦	
目: 旅游平台WBS.mpp	拆分		非活动里程碑 ◇	手动摘要		最后期限	•	
期: 2019年4月25日	里程碑	♦	非活动摘要	(Q)	E	进度		
	摘要		手动任务	仅完成时间 外部任务	3	手动进度		
	项目摘要		仅工期	外部任务				

