


标识号	A	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	年3月11日 五 二	
1	_	*	启动	7 个工作日	2019年3月29日	2019年4月8日		11.	
2		-5	任命项目经理	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日			
3		-5	组建核心团队	1 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日			■ UI 设计师, 产品经:
4		-5	制定时间计划及里程碑	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日			■一项目经理
5		-5	分析干系人	2 个工作日	2019年4月3日	2019年4月4日			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
6		-5	制定项目章程	1 个工作日?	2019年4月5日	2019年4月5日	2, 3, 4, 5		项目经理
7		- 5	项目启动大会	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	6		
8		*	规划	45 个工作日	2019年4月9日	2019年6月10日			
9		-5	规划范围	16 个工作日	2019年4月9日	2019年4月30日			
10		-5	制定需求说明书	8 个工作日	2019年4月9日	2019年4月18日	7		
11		-5	界面设计	5 个工作日	2019年4月19日	2019年4月25日	10		
12		-5	详细设计说明书	5 个工作日	2019年4月19日	2019年4月25日	10		
13		- 5	范围说明书	3 个工作日	2019年4月19日	2019年4月23日	10		
14		- 5	创建WBS	2 个工作日	2019年4月26日	2019年4月29日	11, 12, 13		
15		-5	形成范围基准	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	14		
16		*	规划时间	8 个工作日	2019年5月1日	2019年5月10日			
17		<u></u>	排列工作包顺序	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	15		
18		-5	估算资源	2 个工作日	2019年5月2日	2019年5月3日	17		
19		-5	估算持续时间	2 个工作日	2019年5月7日	2019年5月8日	18		
20		-5	制定进度计划	1 个工作日	2019年5月9日	2019年5月9日	19		
21		*	规划成本	6 个工作日	2019年5月10日	2019年5月17日			
22		-5	项目成本估算	3 个工作日	2019年5月10日	2019年5月14日	20		
23		5	项目预算	2 个工作日	2019年5月15日	2019年5月16日	22		
24		5	规划质量	8 个工作日	2019年5月1日	2019年5月10日			
25		5	制定测试计划	2 个工作日	2019年5月1日	2019年5月2日	15		
26		5	制定测试用例	6 个工作日	2019年5月3日	2019年5月10日	25		
27		*	规划人力资源	4 个工作日	2019年5月17日	2019年5月22日			
28		-5	制定人力资源计划	2 个工作日	2019年5月17日	2019年5月20日	18		
29		5	制定人员配备管理计划	2 个工作日	2019年5月21日	2019年5月22日	28		
30		5	规划沟通	2 个工作日	2019年5月23日	2019年5月24日			
31		5	制定沟通管理计划	2 个工作日	2019年5月23日	2019年5月24日	29		
32		-5	规划采购	4 个工作日	2019年5月27日	2019年5月30日			
33		5	自制外购分析	1 个工作日	2019年5月27日	2019年5月27日	18		
34		-5	制定采购计划	3 个工作日	2019年5月28日	2019年5月30日	33		
			任务	非活动但		手动摘要总成 🗕		外部里程碑	♦
			I 11	非活动里程碑 ◇		手动摘要		最后期限	•
项目:	旅游	平台WBS.mpp					•		
日期:	20194	年3月29日		非活动描		□ 仅开始时间 [进度	
			摘要	手动任务	ī	■ 仅完成时间 】		手动进度	
			项目摘要 『	【 仅工期		外部任务			
					第 1 页				

标识号	A	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	年3月11日 五 二	20194	年3月25日 王 日 四	2019年4月 一 五
35	_	-5	规划风险	3 个工作日	2019年5月31日	2019年6月4日		14 -		-	
36			识别风险	1 个工作日	2019年5月31日	2019年5月31日	16, 21, 24, 27,	5			
37			风险分析	1 个工作日	2019年6月3日	2019年6月3日	36				
38			制定风险登记册	1 个工作目	2019年6月4日	2019年6月4日	37				
39			规划整合	1 个工作日	2019年6月5日	2019年6月5日	38				
40			执行与监控	35 个工作日	2019年5月6日	2019年6月21日	00	-			
41			组建项目团队	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日	18	_			
42			项目执行	10 个工作日	2019年5月6日	2019年5月17日	10				
43		7	游客模块	10 个工作日	2019年5月6日	2019年5月17日					
44		-5	登录注册	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	41	-			
45					2019年5月8日	2019年5月8日	44	_			
46			搜索导游信息	1 个工作日	2019年5月9日	2019年5月9日	45				
47			评价反馈	1 个工作日	2019年5月10日	2019年5月10日	46				
48		-5 -5	个人信息页面	1 个工作日	2019年5月10日	2019年5月10日	47				
49			支付定金	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	48				
50		-5		4 个工作日	2019年5月14日 2019年5月7日	2019年5月14日	40	_			
51		-5	导游认证	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月10日	41	_			
52		-5			2019年5月7日	2019年5月7日	51				
53		-5		1 个工作日		2019年5月6日 2019年5月9日	52				
54		-9	导游信息页面 领取工资		2019年5月9日		53				
55		-9		1 个工作日	2019年5月10日 2019年5月7日	2019年5月10日	ეკ				
56		-5	管理员模块	3 个工作日	2019年5月7日 2019年5月7日	2019年5月9日	41				
57		-5	导游审核	1 个工作日		2019年5月7日	56				
58		-9	流量统计	1 个工作日 1 个工作日	2019年5月8日	2019年5月8日	57				
59		-9	数据备份		2019年5月9日	2019年5月9日	57				
60		-9	项目监控	4 个工作日	2019年6月6日	2019年6月11日	41	_			
61		-9	各项指标监控	1 个工作日	2019年6月6日	2019年6月6日	41	_			
62		-5	监控评审	1 个工作日	2019年6月7日	2019年6月7日	60	_			
	_	-9	变更评审	1 个工作日	2019年6月10日	2019年6月10日	61	_			
63		-5	例会	1 个工作日	2019年6月11日	2019年6月11日	41				
64	_	-9	管理干系人	3 个工作日	2019年6月12日	2019年6月14日	4.1				
65		-9	发布项目信息	1 个工作日	2019年6月12日	2019年6月12日	41				
66		-5	报告监控指标	1 个工作日	2019年6月13日	2019年6月13日	41				
67		-5	干系人沟通	1 个工作日	2019年6月14日	2019年6月14日	41				
68		*	团队建设	3 个工作日	2019年6月17日	2019年6月19日					
			任务	非活动任	务	手动摘要总成 ——	夕	部里程碑	\Diamond		
			拆分	非活动里	程碑 ◇	手动摘要	■ 最	后期限	•		
1		游平台WBS.mpp	里程碑 ◆	非活动摘	要『	□ 仅开始时间 □	讲	度			
日期:	201	9年3月29日	摘要	■ 手动任务		■ 仅完成时间 ■		动进度			
			项目摘要 『	【 仅工期		外部任务	,	,,,,,			
			次日順安	以上別		/I HPI工方					
					第 2 页						

标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	年3月11日 2019年3月25日 2019年4月 五 二 六 三 日 四 一 五
69		-5	培训	1 个工作日	2019年6月17日	2019年6月17日	41	
70	-	-5	娱乐活动	1 个工作日	2019年6月18日	2019年6月18日	41	
71		-	沟通	1 个工作日	2019年6月19日	2019年6月19日	70	
72		-5	采购	1 个工作日	2019年6月20日	2019年6月20日		
73		-5	项目验收	1 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日	42	
74		*	收尾	4 个工作日	2019年6月24日	2019年6月27日		
75		5	项目终验	1 个工作日	2019年6月24日	2019年6月24日	73	
76		5	结束采购	1 个工作日	2019年6月25日	2019年6月25日	73	
77		5	项目内部收尾	1 个工作日	2019年6月26日	2019年6月26日	73	
78		*?						



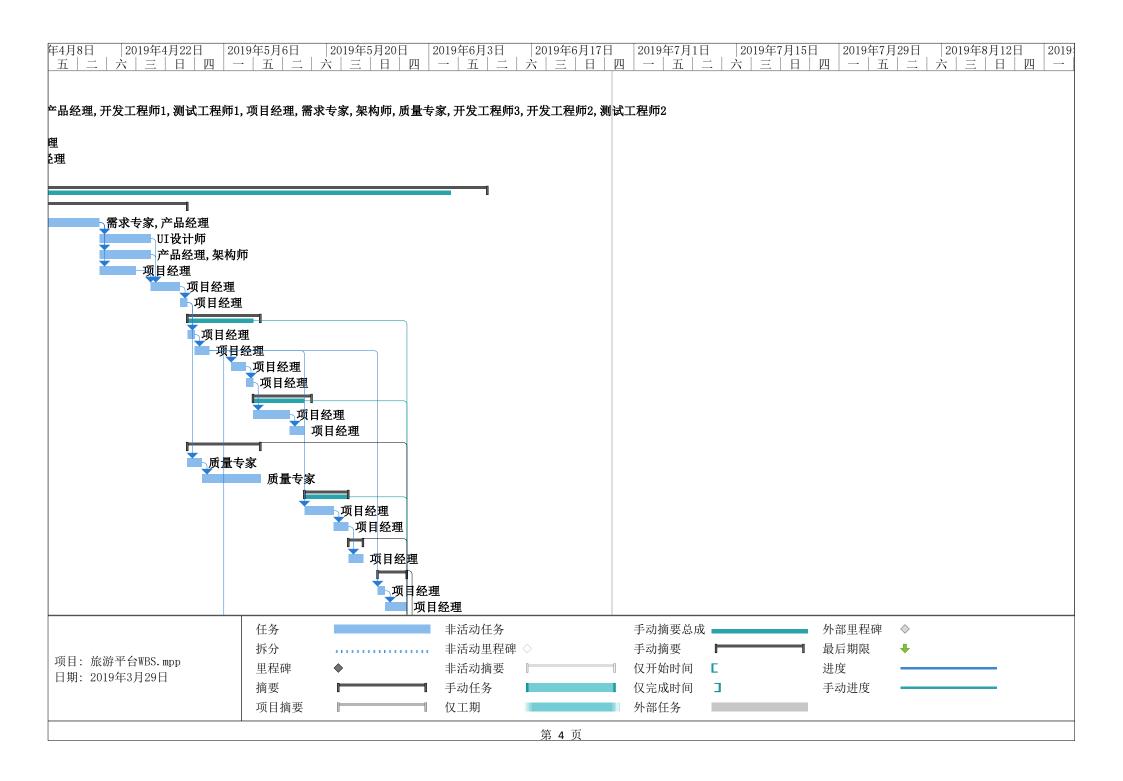

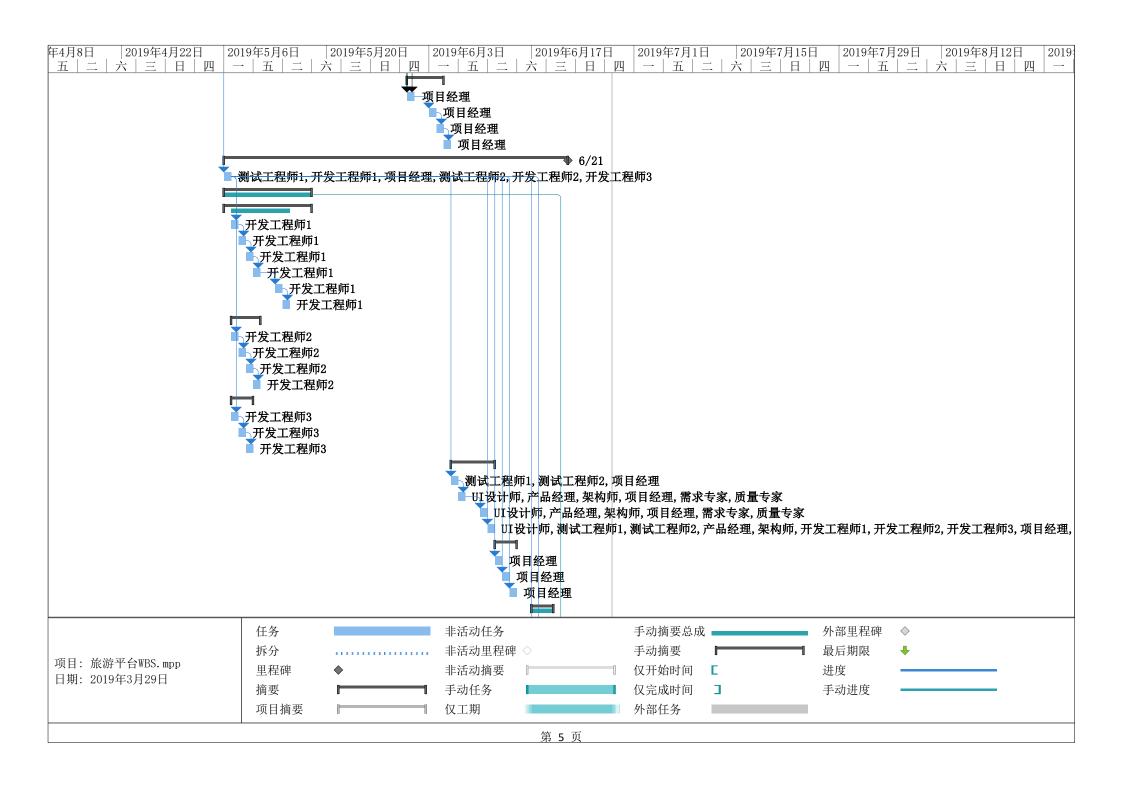

	19年5月6日		019年6月3日	2019年6月17日	2019年7月1日			
五 二 六 三 日 四 -	- 五 二 7	六 三 日 四	一 五 二	六 三 日 四	<u> 一 五 .</u> T程师1 测试-	二 六 三 E C程师2 产品经理	四 一 五 四 一 五	<u> 二 六 三 日 四 一</u> 星炉1, 开 <mark>发工程</mark> 师2, 开发工程师3,
								程师1,开发工程师2,开发工程师3
								二程师1,开发工程师2,开发工程师
				项目经理				
				■ UI设计 师,	产品经理,架构	的师,项目经理,需	求专家,质量专家	
				III 投让	├//// 产品经理	如构师 项目经理	,需求专家,质量专	÷家
				项目	经理	水内/内, 火口 紅在	,而外人物,从至、	
				ΨUI	设计师,测试工	程师1,测试工程师	j2,产品经理,架构	师,开发工程师1,开发工程师2,开
	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	♦
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		■ 最后期限	+
项目:旅游平台WBS.mpp	里程碑	♦	非活动摘要		仅开始时间	E	进度	
日期: 2019年3月29日	摘要	1	手动任务		仅完成时间	3	手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			
				** c 于				
				第 6 页				
