


只号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本
1	启动	7 个工作日	2019年3月29日	2019年4月8日			¥8, 700. 00
2	任命项目经理	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日			¥0.00
3	组建核心团队	1 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日		UI设计师,产品	品丝¥6, 300.00
4	制定时间计划及里程碑	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日		项目经理	¥600.00
5	分析干系人	2 个工作日	2019年4月3日	2019年4月4日		项目经理	¥1,200.00
5	制定项目章程	1 个工作日?	2019年4月5日	2019年4月5日	2, 3, 4, 5	项目经理	¥600.00
	项目启动大会	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	6		¥0.00
•	规划	45 个工作日	2019年4月9日	2019年6月10日			¥42,600.00
	规划范围	16 个工作日	2019年4月9日	2019年4月30日			¥21, 200. 00
)	制定需求说明书	8 个工作日	2019年4月9日	2019年4月18日	7	需求专家,产品	品丝¥9,600.00
	界面设计	5 个工作日	2019年4月19日	2019年4月25日	10	UI设计师	¥2,000.00
2	详细设计说明书	5 个工作日	2019年4月19日	2019年4月25日	10	产品经理,架机	勾贞¥6,000.00
3	范围说明书	3 个工作日	2019年4月19日	2019年4月23日	10	项目经理	¥1,800.00
-9	创建WBS	2 个工作日	2019年4月26日	2019年4月29日	11, 12, 13	项目经理	¥1, 200.00
_	形成范围基准	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	14	项目经理	¥600.00
<u> </u>	规划时间	8 个工作日	2019年5月1日	2019年5月10日			¥3, 600. 00
	排列工作包顺序	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日	15	项目经理	¥600.00
	估算资源	2 个工作日	2019年5月2日	2019年5月3日	17	项目经理	¥1,200.00
	估算持续时间	2 个工作日	2019年5月7日	2019年5月8日	18	项目经理	¥1, 200.00
	制定进度计划	1 个工作日	2019年5月9日	2019年5月9日	19	项目经理	¥600.00
<b>→</b>	规划成本	6 个工作日	2019年5月10日	2019年5月17日		八月二二	¥3, 000. 00
2	项目成本估算	3 个工作日	2019年5月10日	2019年5月14日	20	项目经理	¥1,800.00
	项目预算	2 个工作日	2019年5月15日	2019年5月16日	22	项目经理	¥1, 200. 00
	规划质量	8 个工作日	2019年5月1日	2019年5月10日		,,,,, <u></u>	¥6, 400. 00
	制定测试计划	2 个工作日	2019年5月1日	2019年5月2日	15	质量专家	¥1,600.00
	制定测试用例	6 个工作日	2019年5月3日	2019年5月10日	25	质量专家	¥4,800.00
<b>→</b>	规划人力资源	4 个工作日	2019年5月17日	2019年5月22日		7,11,13	¥2, 400. 00
	制定人力资源计划	2 个工作日	2019年5月17日	2019年5月20日	18	项目经理	¥1, 200. 00
	制定人员配备管理计划	2 个工作日	2019年5月21日	2019年5月22日	28	项目经理	¥1, 200. 00
	规划沟通	2 个工作日	2019年5月23日	2019年5月24日		2,,,,,=====	¥1, 200. 00
	制定沟通管理计划	2 个工作日	2019年5月23日	2019年5月24日	29	项目经理	¥1, 200. 00
	规划采购	4 个工作日	2019年5月27日	2019年5月30日		7, 6, 22, 3	¥2, 400. 00
B	自制外购分析	1 个工作日	2019年5月27日	2019年5月27日	18	项目经理	¥600.00
	制定采购计划	3 个工作日	2019年5月28日	2019年5月30日	33	项目经理	¥1,800.00
	任务			手动摘要总成		外部里程碑 ◇	,==,
	1= 11			手动摘要		最后期限  ◆	
目: 旅游平台WBS.mpp					a a		
期: 2019年4月25日	里程碑 ◆	非活动指 		□ 仅开始时间 □		进度	
	摘要	手动任务	ī	■ 仅完成时间 ■		手动进度 ——	
	项目摘要 『	【 仅工期		外部任务			
			第 1 页				

识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本
35	-	规划风险	3 个工作日	2019年5月31日	2019年6月4日			¥1, 800. 00
36		识别风险	1 个工作日	2019年5月31日	2019年5月31日	16, 21, 24, 27,	:项目经理	¥600.00
37		风险分析	1 个工作日	2019年6月3日	2019年6月3日	36	项目经理	¥600.00
38	•	制定风险登记册	1 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日	37	项目经理	¥600.00
39	•	规划整合	1 个工作日	2019年6月5日	2019年6月5日	38	项目经理	¥600.00
40	-5	执行与监控	35 个工作日	2019年5月6日	2019年6月21日		71712	¥50, 200. 00
41	-	组建项目团队	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日	18	测试工程师1,开	
42	*	项目执行	10 个工作日	2019年5月6日	2019年5月17日		V.V. 1=71 771	¥6, 500.00
43	<b>∤</b> <b>∤</b> □	游客模块	10 个工作日	2019年5月6日	2019年5月17日			¥3,000.00
44		登录注册	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	41	开发工程师1	¥500.00
45	- <u>a</u>	发布期望导游信息	1 个工作日	2019年5月8日	2019年5月8日	44	开发工程师1	¥500.00
46	•	搜索导游信息	1 个工作日	2019年5月9日	2019年5月9日	45	开发工程师1	¥500.00
47	-	评价反馈	1 个工作日	2019年5月10日	2019年5月10日	46	开发工程师1	¥500.00
48	-	个人信息页面	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	47	开发工程师1	¥500.00
49	-6 -6	支付定金	1 个工作日	2019年5月14日	2019年5月14日	48	开发工程师1	¥500.00
50	- <b>9</b>	导游模块	4 个工作日	2019年5月7日	2019年5月10日		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	¥2,000.00
51	-	导游认证	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	41	开发工程师2	¥500.00
52	-5	发布旅游解说信息	1 个工作日	2019年5月8日	2019年5月8日	51	开发工程师2	¥500.00
53	-5	导游信息页面	1 个工作日	2019年5月9日	2019年5月9日	52	开发工程师2	¥500.00
54		领取工资	1 个工作日	2019年5月10日	2019年5月10日	53	开发工程师2	¥500.00
55	6 6 6	管理员模块	3 个工作日	2019年5月7日	2019年5月9日		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	¥1,500.00
56	-5	导游审核	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日	41	开发工程师3	¥500.00
57	-5	流量统计	1 个工作日	2019年5月8日	2019年5月8日	56	开发工程师3	¥500.00
58	-9	数据备份	1 个工作日	2019年5月9日	2019年5月9日	57	开发工程师3	¥500.00
59	-	项目监控	4 个工作日	2019年6月6日	2019年6月11日			¥15, 500. 00
60	-	各项指标监控	1 个工作日	2019年6月6日	2019年6月6日	41	测试工程师1,测	
61	-	监控评审	1 个工作日	2019年6月7日	2019年6月7日	60	UI设计师,产品约	¥3,800.00
62	-9	变更评审	1 个工作日	2019年6月10日	2019年6月10日	61	UI设计师,产品约	
33	-	例会	1 个工作日	2019年6月11日	2019年6月11日	41	UI设计师,测试	
64	-	管理干系人	3 个工作日	2019年6月12日	2019年6月14日			¥1,800.00
65	-5	发布项目信息	1 个工作日	2019年6月12日	2019年6月12日	41	项目经理	¥600.00
65 <b>III</b> 66 <b>III</b>	-5 -5	报告监控指标	1 个工作日	2019年6月13日	2019年6月13日	41	项目经理	¥600.00
67	-	干系人沟通	1 个工作日	2019年6月14日	2019年6月14日	41	项目经理	¥600.00
68	*	团队建设	3 个工作日	2019年6月17日	2019年6月19日		·	¥18, 900. 00
		任务	非活动任		手动摘要总成	外	部里程碑 ◇	
			非活动里		手动摘要		后期限  ◆	
[目: 旅游平	左台WBS.mpp	里程碑 ◆	非活动摘		<ul><li>□ 仅开始时间 </li></ul>	进		
期: 2019年	E4月25日	摘要			<ul><li>【公开始时间 【</li><li>【公开始时间 】</li><li>【公完成时间 】</li></ul>		·····································	
		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	又工期		外部任务	,		
		次日聊女	1 人工为		/ / 旧			


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称    成本
69	-9	培训	1 个工作日	2019年6月17日	2019年6月17日	41	UI设计师,测试 346,300.00
70	-9	娱乐活动	1 个工作日	2019年6月18日	2019年6月18日	41	UI设计师,测试 346,300.00
71	-9	沟通	1 个工作日	2019年6月19日	2019年6月19日	70	UI设计师,测试□¥6,300.00
72	-5	采购	1 个工作日	2019年6月20日	2019年6月20日		项目经理 ¥600.00
73	-5	项目验收	1 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日	42	UI设计师,产品纠3,800.00
74	*	收尾	4 个工作日	2019年6月24日	2019年6月27日		¥10, 700. 00
75	-	项目终验	1 个工作日	2019年6月24日	2019年6月24日	73	UI设计师,产品约¥3,800.00
76	-	结束采购	1 个工作日	2019年6月25日	2019年6月25日	73	项目经理 ¥600.00
77	-	项目内部收尾	1 个工作日	2019年6月26日	2019年6月26日	73	UI设计师,测试□¥6,300.00
78	x,						¥0.00




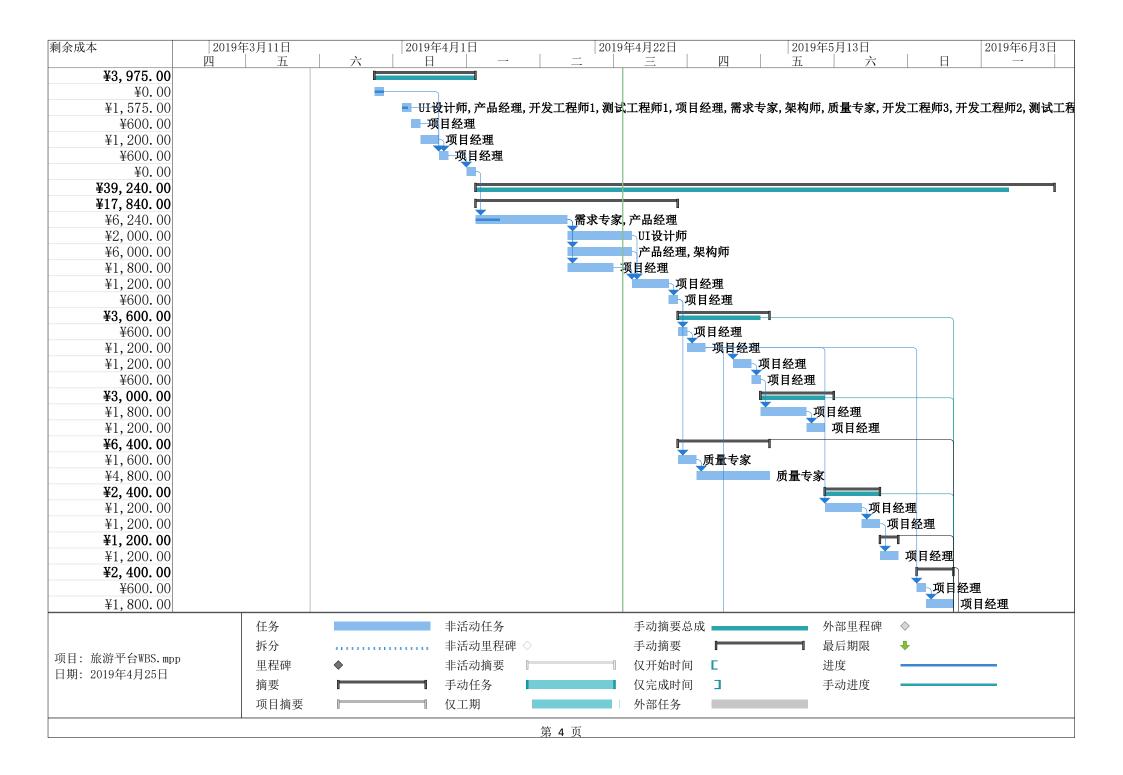

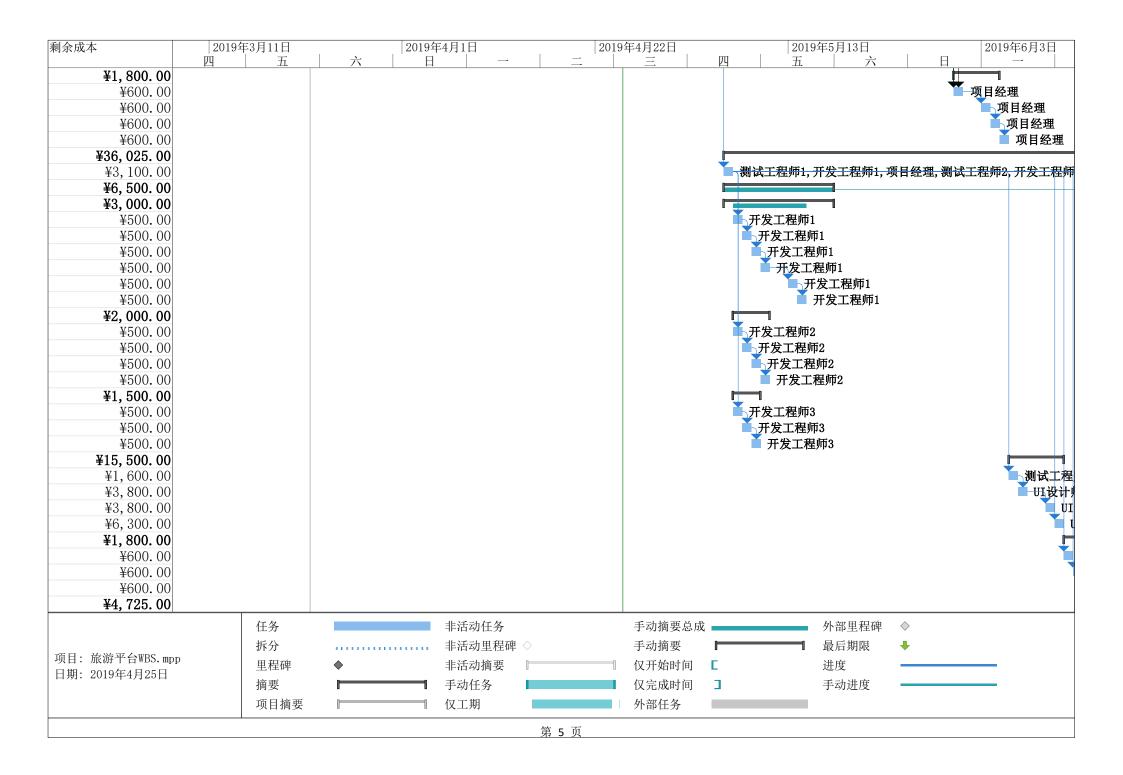

<b></b>	2019年3月11日 四   五	2019年   六   日	4月1日		年4月22日 三	四	2019年 五	5月13日		2019年6月3日
¥0.00		/				<u> </u>		/ / /		
¥0.00 ¥4,725.00										
¥600.00										
¥3,800.00										
¥10, 700. 00										
¥3, 800. 00 ¥600. 00										
¥6, 300. 00										
¥0.00										
	任务		非活动任务		手动摘要总成	ζ	夕	部里程碑	<b>♦</b>	
	拆分		非活动里程碑 ◇		手动摘要			<b>是后期限</b>	•	
项目: 旅游平台WBS.mpp	里程碑		非活动摘要		仅开始时间	С		连度		
日期: 2019年4月25日	摘要		手动任务		仅完成时间	3		动进度		
	项目摘要		仅工期 📉		外部任务					
				96页						

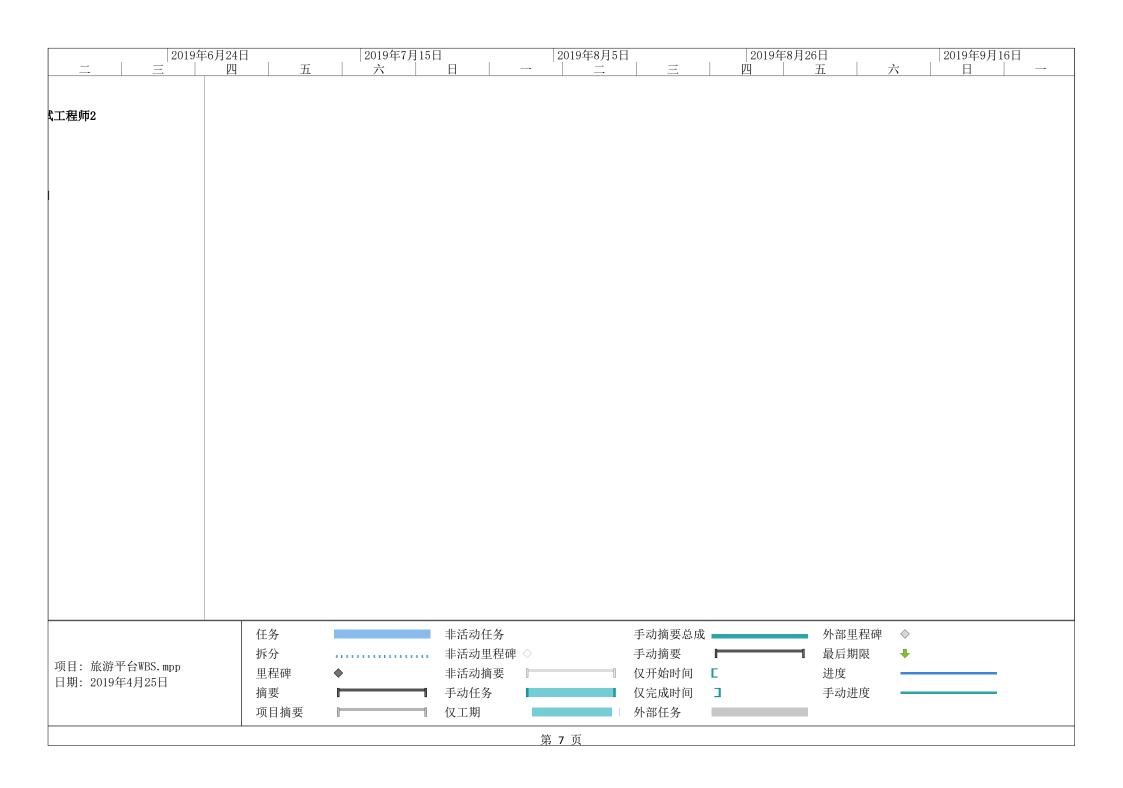

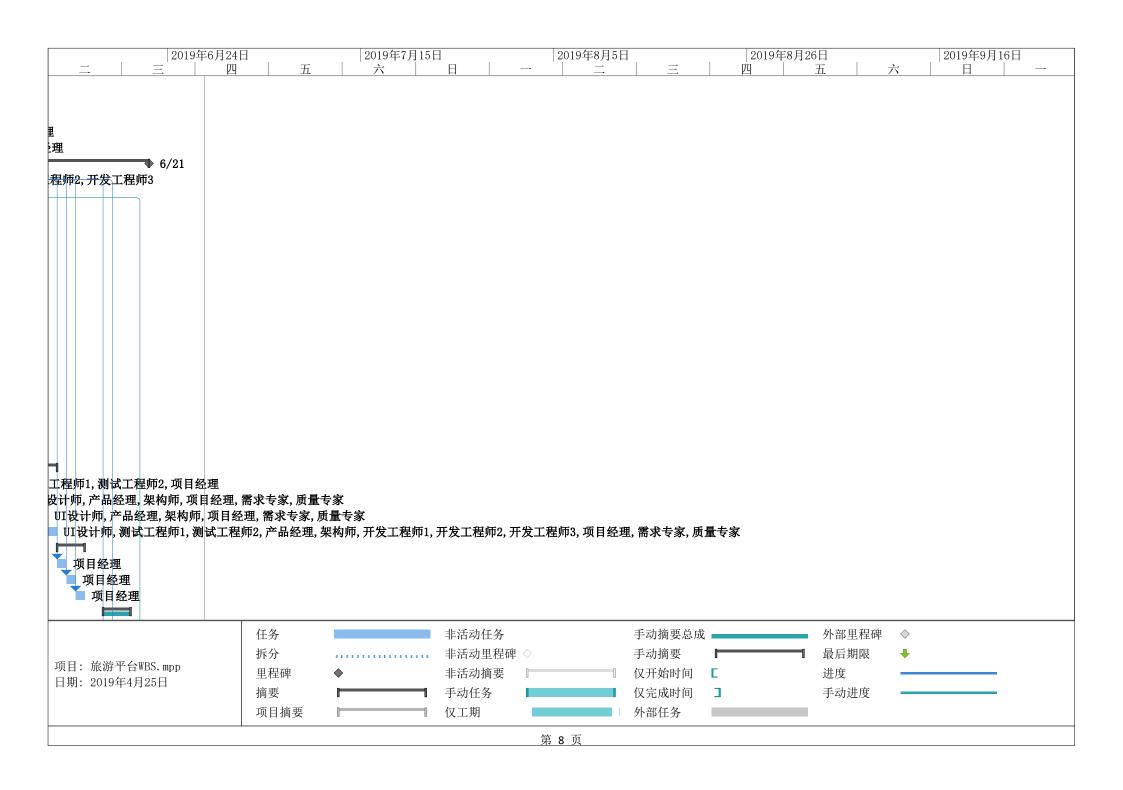

2019年6月24日
□ UI设计师,测试工程师1,测试工程师2,产品经理,架构师,开发工程师1,开发工程师2,开发工程师3,项目经理,需求专家,质量专家 □ UI设计师,测试工程师1,测试工程师2,产品经理,架构师,开发工程师1,开发工程师2,开发工程师3,项目经理,需求专家,质量专家 □ UI设计师,测试工程师1,测试工程师2,产品经理,架构师,开发工程师1,开发工程师2,开发工程师3,项目经理,需求专家,质量专家 □ 项目经理 □ UI设计师,产品经理,架构师,项目经理,需求专家,质量专家 □ UI设计师,产品经理,架构师,项目经理,需求专家,质量专家 □ UI设计师,产品经理,架构师,项目经理,需求专家,质量专家 □ 项目经理
UI设计师,测试工程师1,测试工程师2,产品经理,架构师,开发工程师1,开发工程师2,开发工程师3,项目经理,需求专家,质量专家 UI设计师,测试工程师1,测试工程师2,产品经理,架构师,开发工程师1,开发工程师2,开发工程师3,项目经理,需求专家,质量专家 项目经理 UI设计师,产品经理,架构师,项目经理,需求专家,质量专家 UI设计师,产品经理,架构师,项目经理,需求专家,质量专家 项目经理
□I设计师,测试工程师1,测试工程师2,产品经理,架构师,开发工程师1,开发工程师2,开发工程师3,项目经理,需求专家,质量专家 □ 项目经理 □ UI设计师,产品经理,架构师,项目经理,需求专家,质量专家 □ UI设计师,产品经理,架构师,项目经理,需求专家,质量专家 □ 项目经理 □ UI设计师,产品经理,架构师,项目经理,需求专家,质量专家 □ 项目经理
UI设计师,产品经理,架构师,项目经理,需求专家,质量专家 UI设计师,产品经理,架构师,项目经理,需求专家,质量专家 项目经理
UI 设计师, 产品经理, 架构师, 项目经理, 需求专家, 质量专家 项目经理
项 <b>目经理</b>
项 <b>目经理</b>
UI设计师,测试工程师1,测试工程师2,产品经理,架构师,开发工程师1,开发工程师2,开发工程师3,项目经理,需求专家,质量专家
任务 非活动任务 手动摘要总成 ———— 外部里程碑 ◇
│
项目: 旅游平台WBS.mpp
日期: 2019年4月25日
项目摘要
第 9 页

